

PCH PIRAPORA

APRESENTAÇÃO
CONSELHO DE FISCAL – CF – 23/06/2015

Marcos Resolutivos

- ✓ Ponte Rolante – 24/04/2015
- ✓ Limpa Grades – 25/05/2015
- ✓ Geração da UG01 – 17/07/2015
- ✓ Geração da UG02 – 02/10/2015

Ponte Rolante da Tomada d'água



Serviço	Status	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Montagem	prev.	■	■					
	exec.	■	■					
Comissionamento	prev.			■				
	exec.			■				

■ Atividade Adiantada


■ Atividade Concluída

■ Atividade Atrasada

Recuperação das Grades



Recuperação das Grades

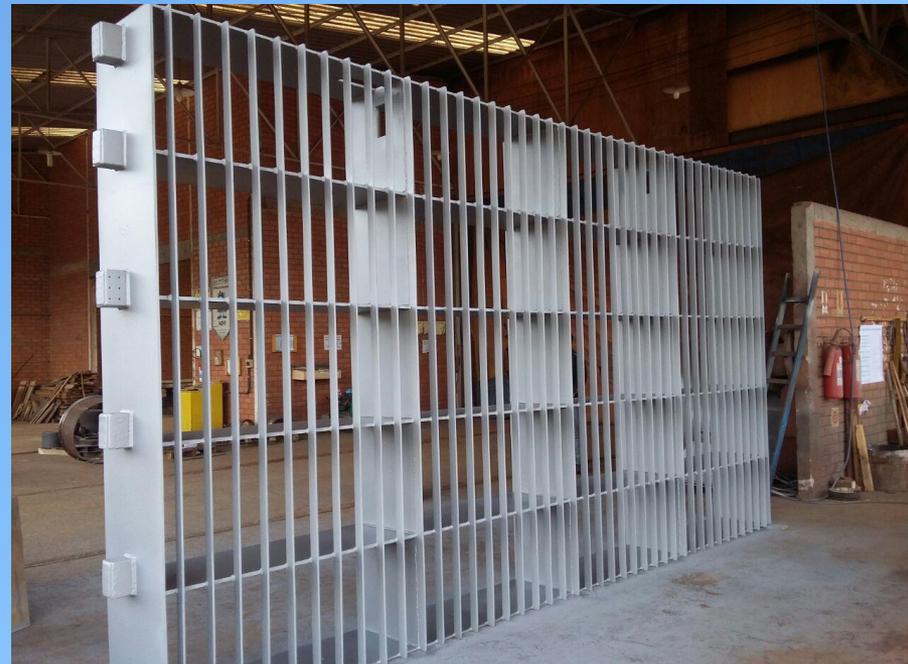

Serviço	Status	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Correções	prev.	■	■	■				
	exec.	■	■	■				
Montagem	prev.		■	■				
	exec.		■	■	■			



Atividade Adiantada



Atividade Concluída



Atividade Atrasada

Recuperação das Grades



Máquina Limpa Grades



Serviço	Status	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Instalação	prev.							
	exec.							
Comissionamento	prev.							
	exec.							

Atividade Adiantada

Atividade Concluída

Atividade Atrasada

Máquina Limpa Grades



Recuperação do Conduto e Válvula Borboleeta



Recuperação do Conduto e Válvula Borboleeta



Recuperação do Conduto e Válvula Borboleeta




Recuperação do Conduto e Válvula Borboleeta



Recuperação da Caixa Espiral e UG




Recuperação da Caixa Espiral e UG

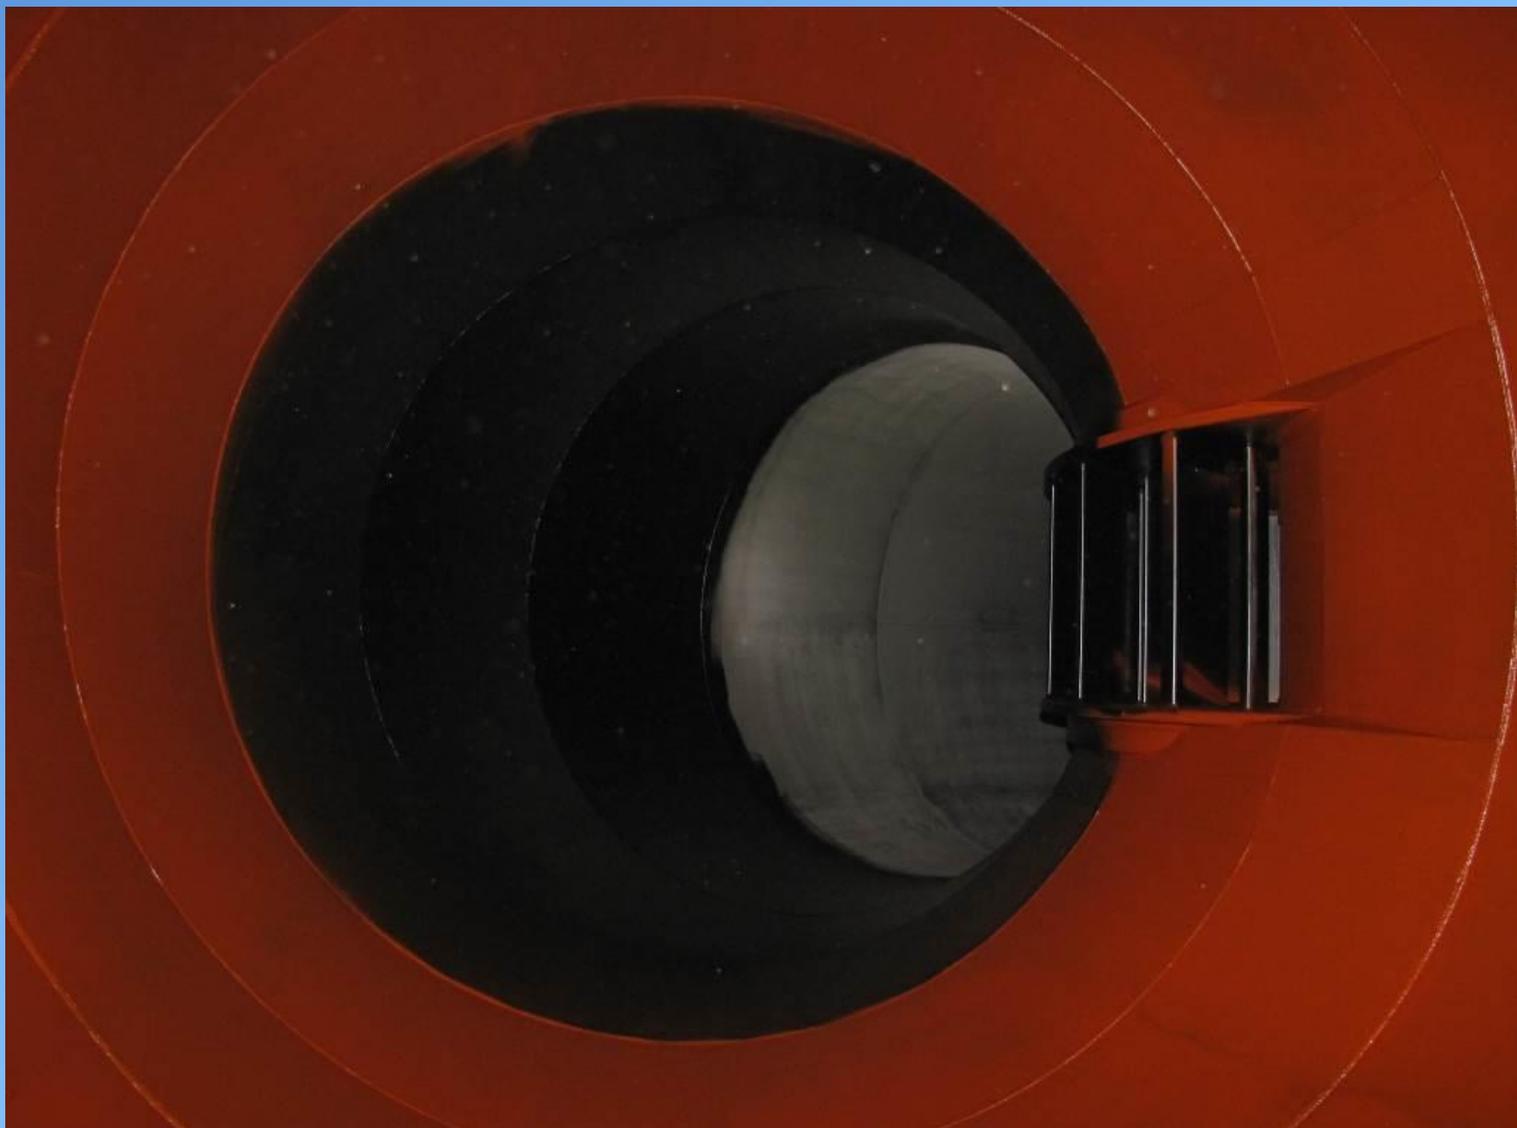

Recuperação da Caixa Espiral e UG




Recuperação da Caixa Espiral e UG

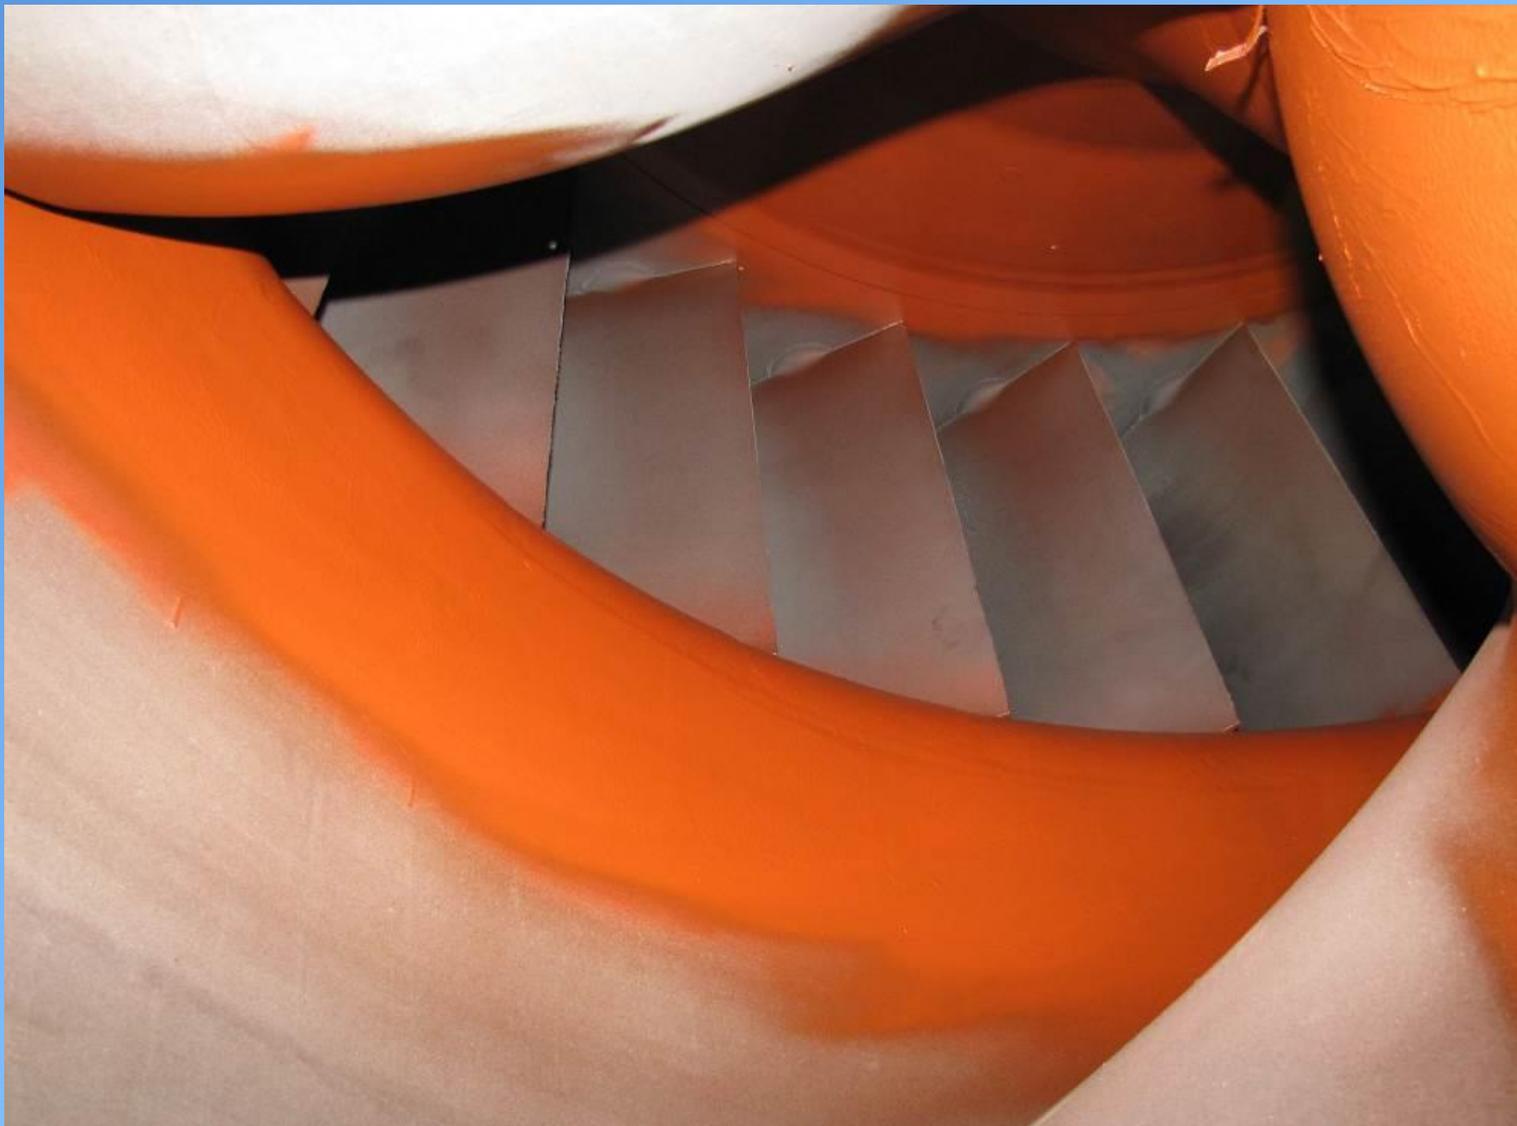

Recuperação da Caixa Espiral e UG



Recuperação da Caixa Espiral e UG

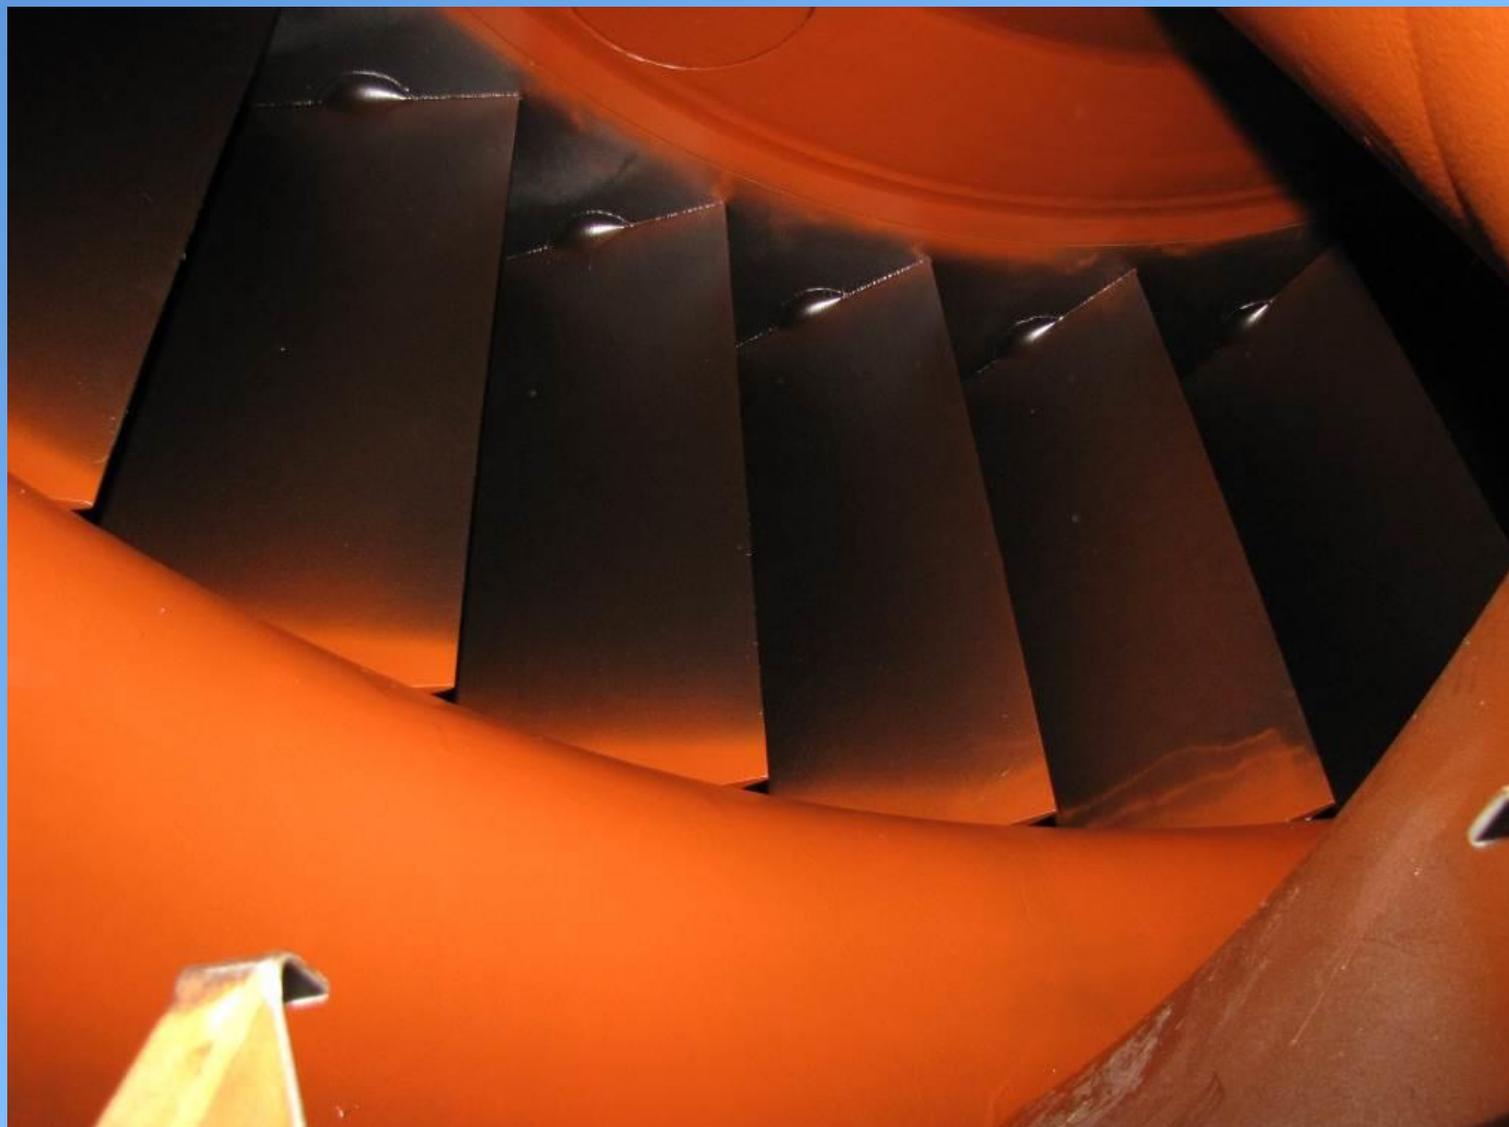

Recuperação da Caixa Espiral e UG




Recuperação da Caixa Espiral e UG



Recuperação da Caixa Espiral e UG



Recuperação da Caixa Espiral e UG

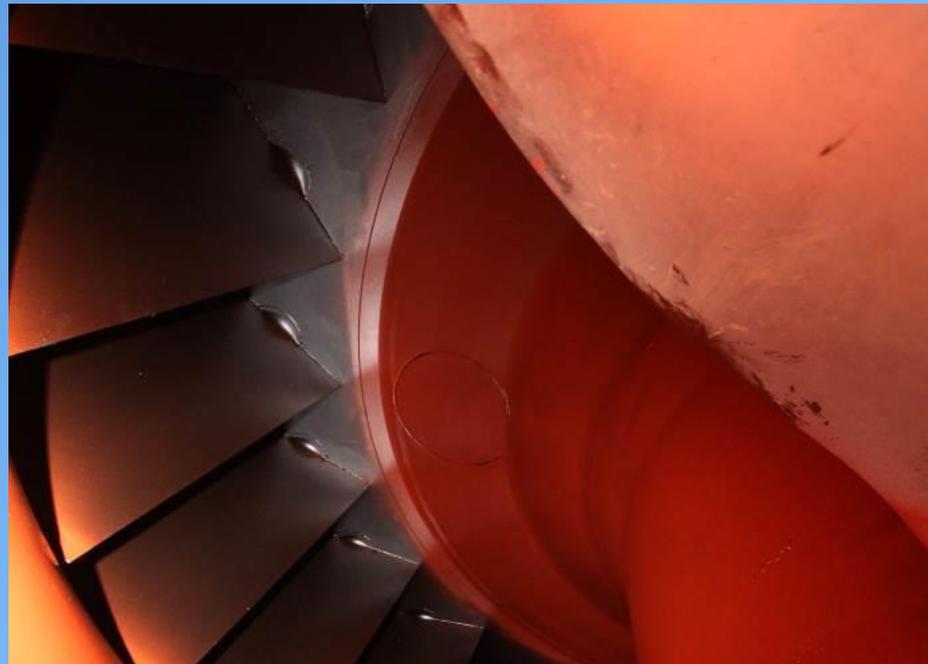

Serviço	Status	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Serviços Preliminares	prev.	■	■	■				
	exec.	■	■	■				
Preparação e Pintura	prev.		■	■	■	■	■	
	exec.		■	■	■	■		
Enchimento do Túnel	prev.				■	■		
	exec.							

■ Atividade Adiantada

■ Atividade Concluída

■ Atividade Atrasada

Recuperação da Caixa Espiral e UG

Serviço	Status	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
Unidade Geradora 01									
Serviços Preliminares	prev.	■	■	■					
	exec.	■	■	■					
Preparação e Pintura	prev.		■	■	■	■	■	■	
	exec.		■	■	■	■	■	■	
Comissionamento	prev.				■	■			
	exec.								
Unidade Geradora 02									
Preparação e Pintura	prev.					■	■	■	■
	exec.		■	■	■	■	■		
Comissionamento	prev.							■	■
	exec.								

■ Atividade Adiantada

■ Atividade Concluída

■ Atividade Atrasada
