


RECUPERAÇÃO DA PCH PIRAPORA

PIRAPORA ENERGIA S. A.

Conselho Fiscal


21/02/2017

Cronograma Macro para retorno em Geração da PCH Pirapora

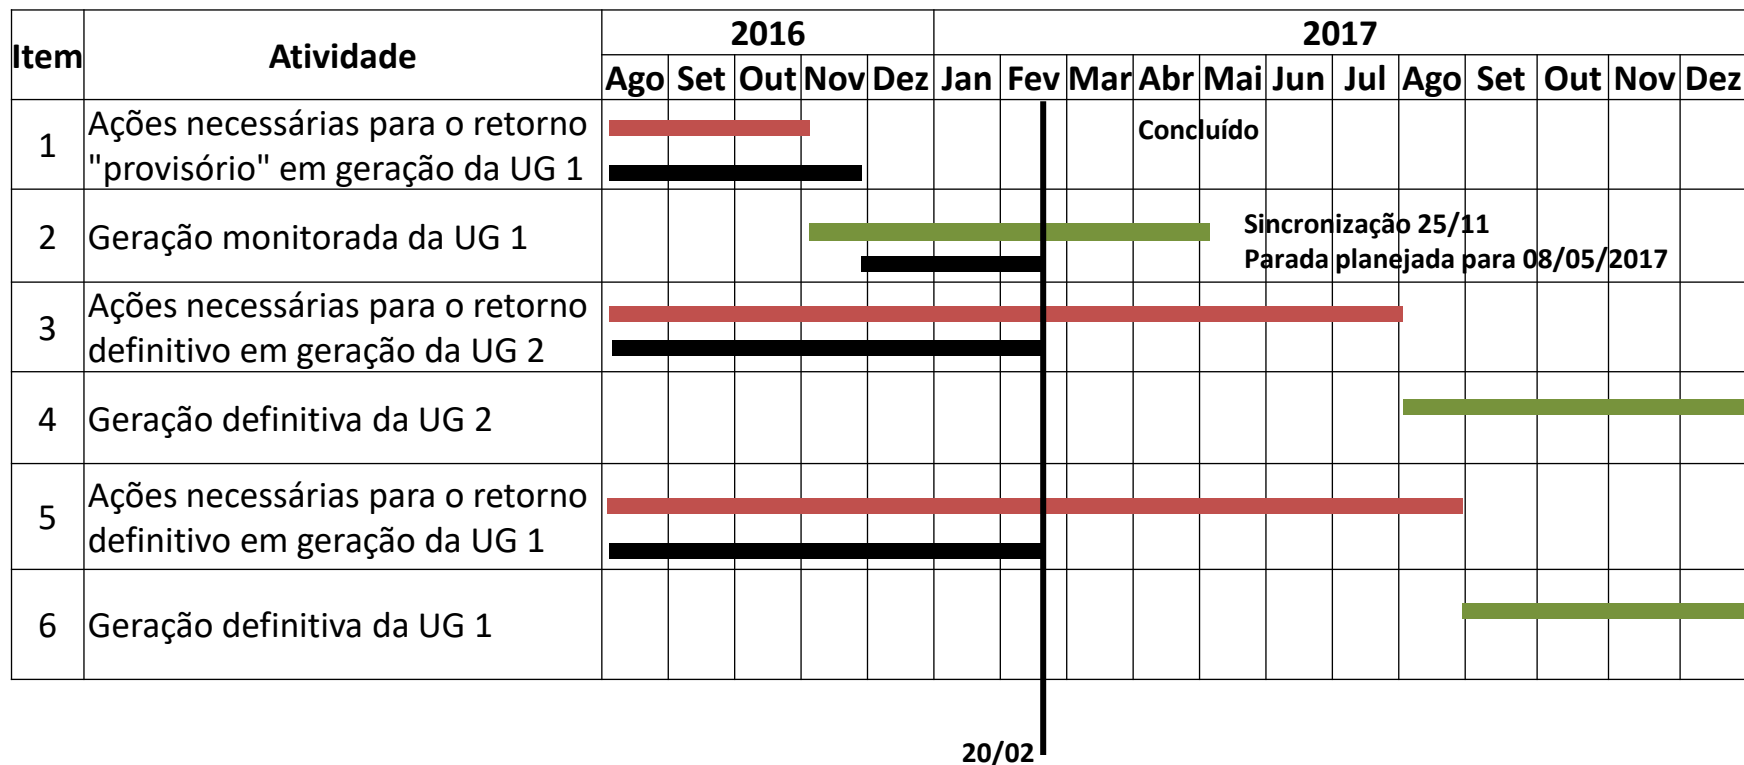


PIRAPORA ENERGIA S. A.

Cronograma para retorno em Geração Provisória da PCH Pirapora (Posição em 20/02/17)

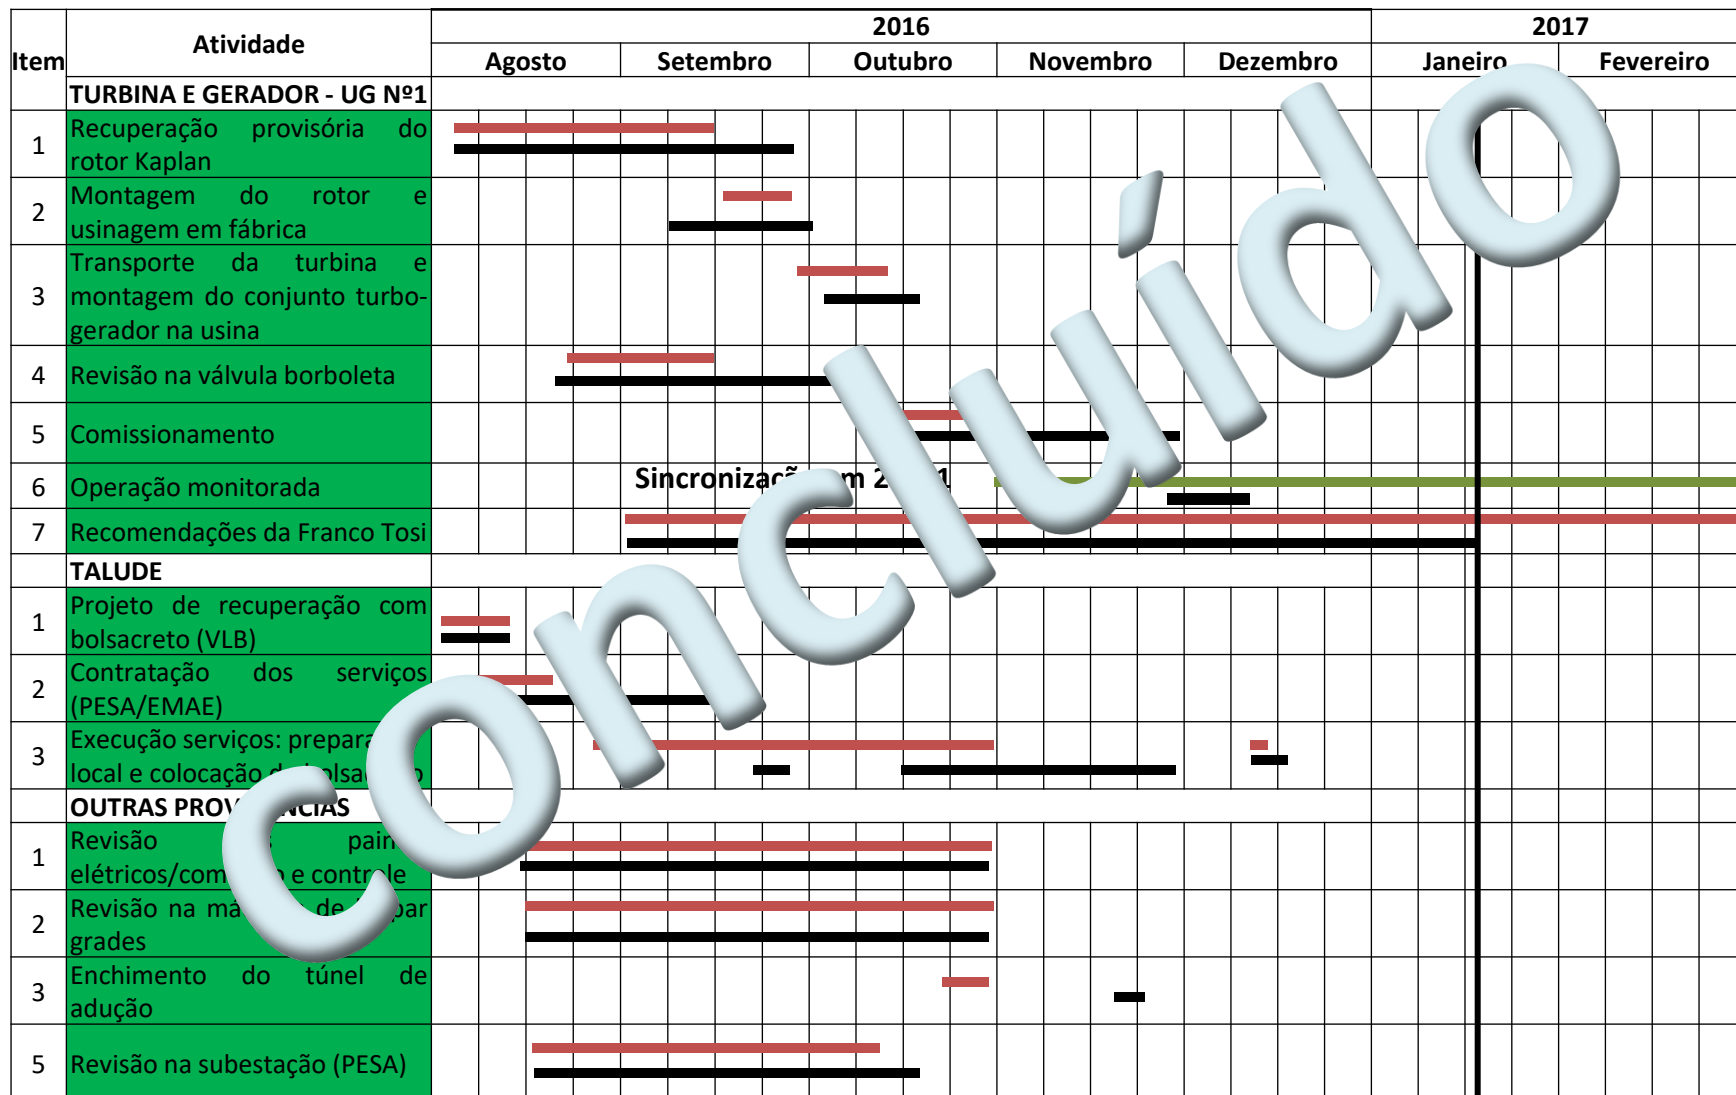

PIRAPORA ENERGIA S. A.

Cronograma Geração Definitiva PCH Pirapora- Atividades Consórcio

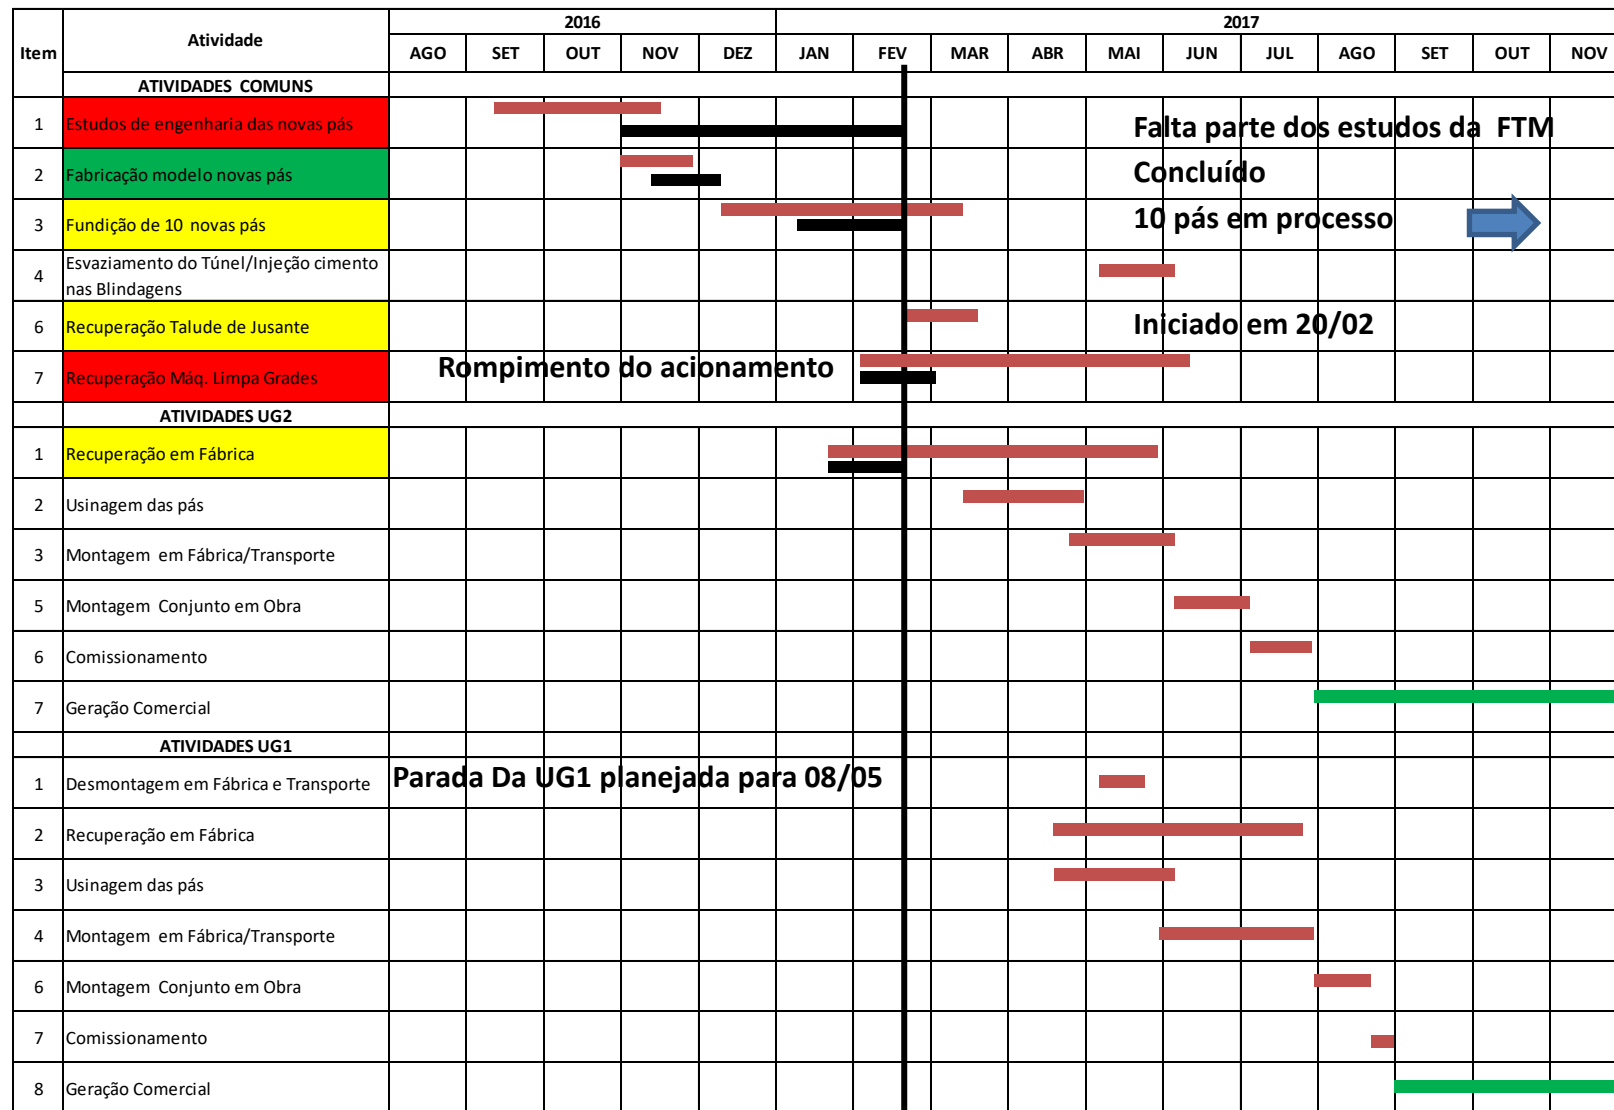

20/02


PIRAPORA ENERGIA S. A.

Cronograma Geração Definitiva PCH Pirapora- Atividades PESA/EMAE

Item	Atividade	2016					2017											
		AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
	GERAL																	
1	Inspeção Obras Cíveis																	
2	AVCB																	
3	Renovação da L.O (Solicitação)																	
4	Peças de Reserva (Definição)																	
	TOMADA D´ÁGUA																	
1	Melhoria Barreira de Detritos																	
2	Estudo Implantação Nova Barreira																	
	EQUIP. TÚNEL DE DESCARGA																	
1	Comporta Ensecadeira																	
2	Pórtico																	
3	Sistema Hidráulico																	
4	Acessórios																	
	TALUDE ATRÁS C.DE FORÇA																	
1	Sistema de Drenagem (Canaletas)																	
2	Correção de Trincas																	
	TALUDE DE JUSANTE																	
1	Avaliação das causas da ruptura (IPT)																	

PIRAPORA ENERGIA S. A.

Gráfico da Produção Integralizada do Sistema de Medição para Faturamento – SMF

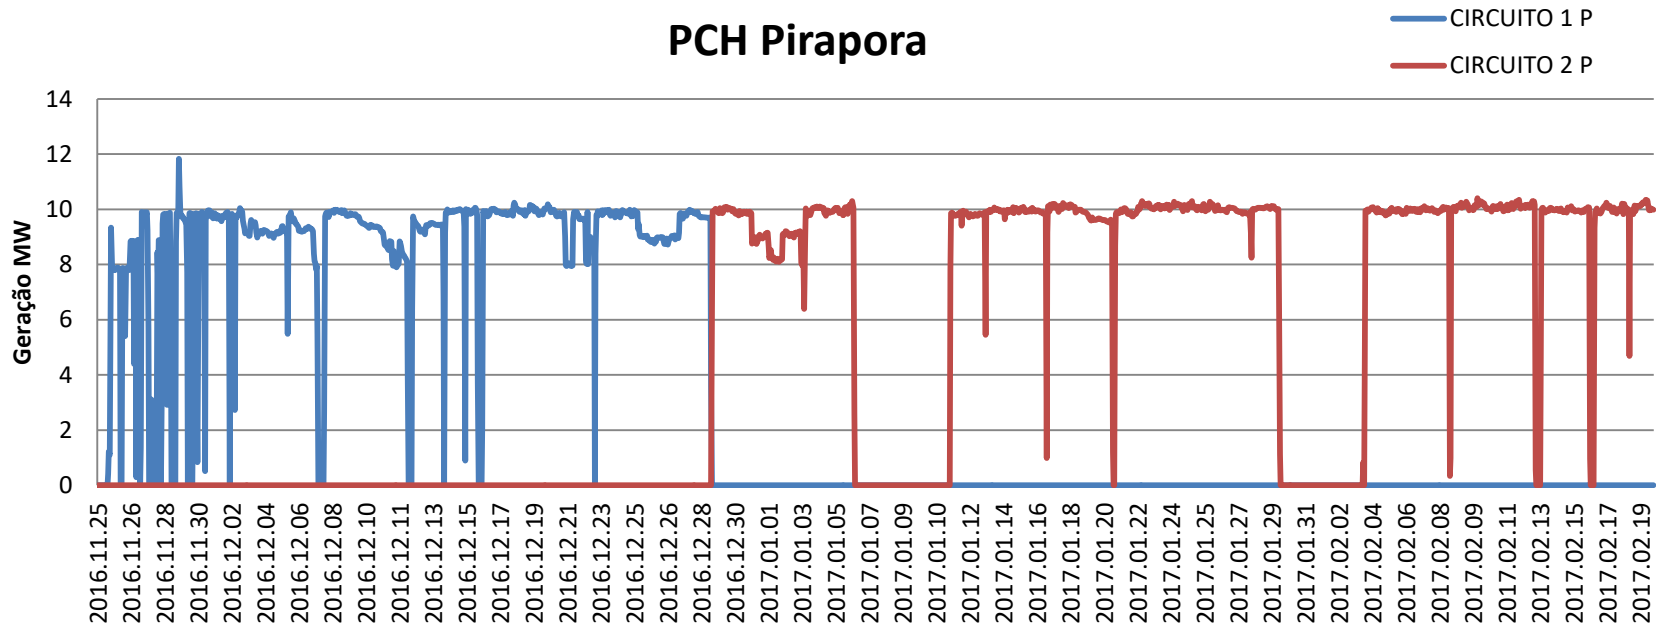


Segunda Inspeção nas Pás após 930 + 450 horas de Operação (de 30/01 a 03/02/2017)

- As 3 trincas detectadas na 1ª inspeção permaneceram estáveis
- Programada nova inspeção nas pás após mais 750 hs de operação (prev. 10/03/2017)
- Avaliar evolução das trincas
- Programar futuras inspeções nas pás

PIRAPORA ENERGIA S. A.

GERAÇÃO MÉDIA X MRE

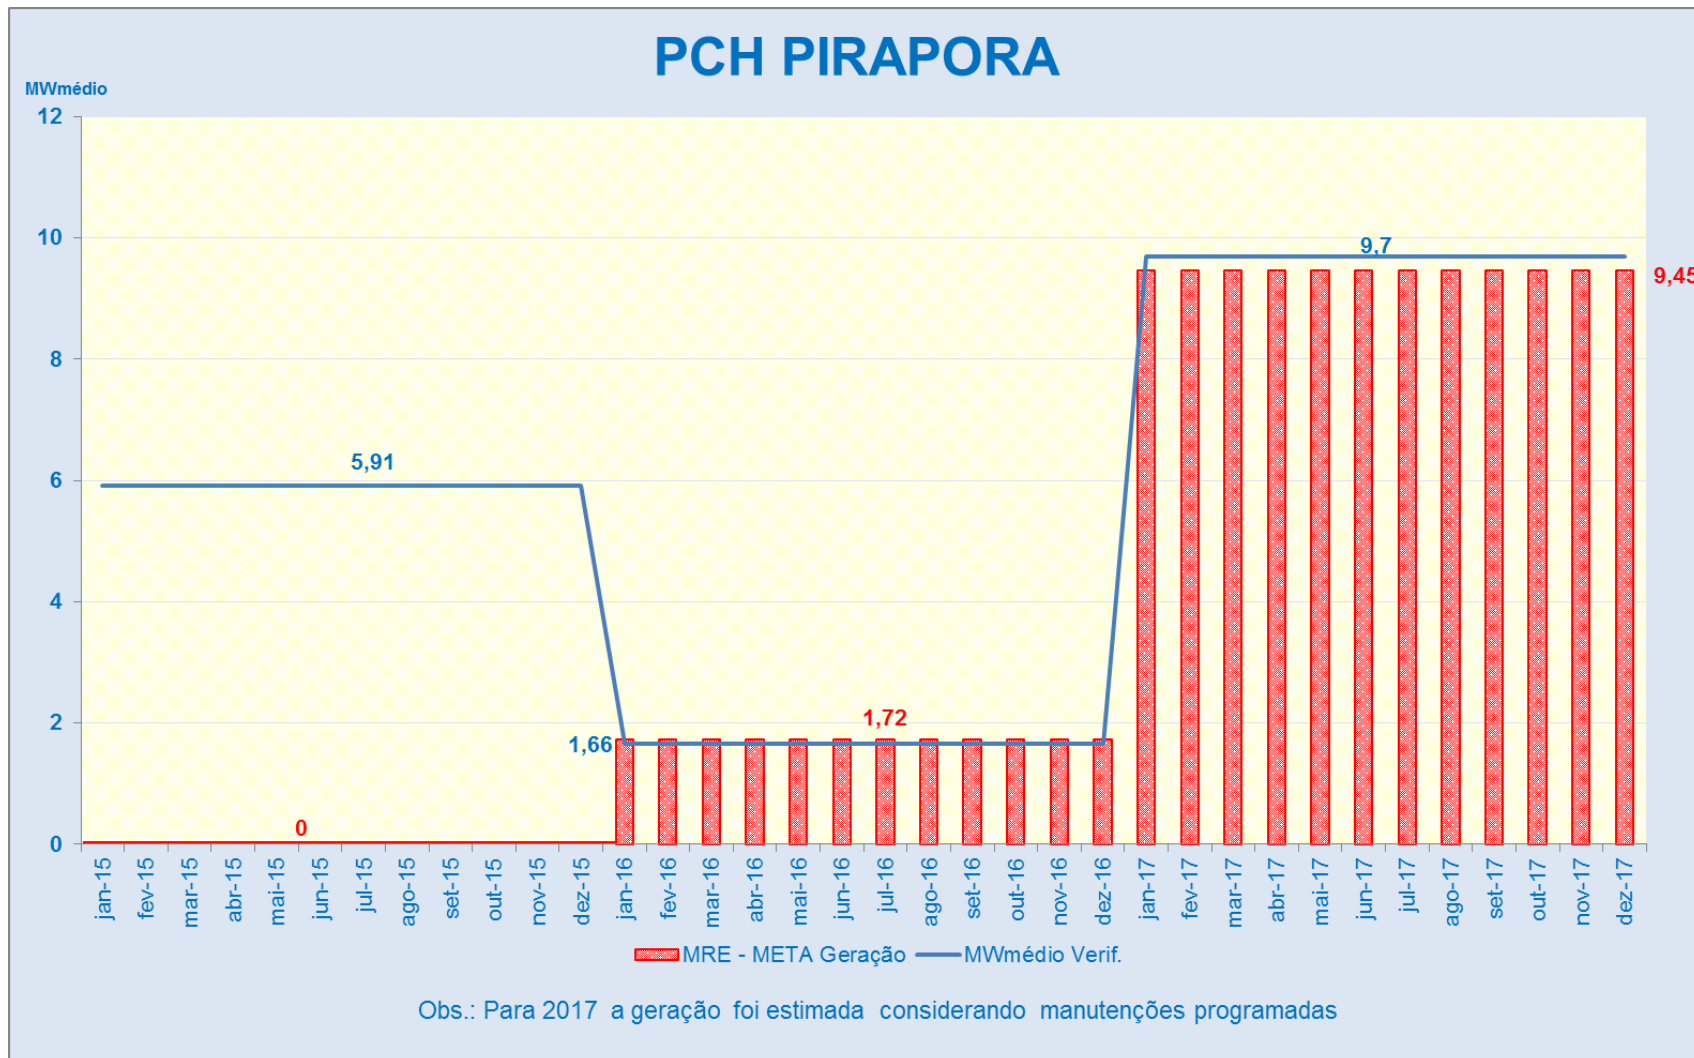

FUNDIÇÃO DAS NOVAS PÁS KAPLAN



Pás em Tratamento Térmico



Pá Jateada pronta para ensaios

